



# GEMEINDE BINNINGEN

Gemeinderat

Zuständig: Ulrich Blümmert  
Ressort: Projektmanagement  
Direkt: 061 425 53 00  
E-Mail: [ulrich.bluemmert@binningen.bl.ch](mailto:ulrich.bluemmert@binningen.bl.ch)

Binningen, 14. Juli 2026

## **Erweiterung Primarschule Meiriacker Rottmannsbodenstrasse 115, Binningen Informationen zum Baubeginn**

Das Projekt umfasst den Rückbau der bestehenden Provisorien und des Turnhallengebäudes, den Neubau eines Schulgebäudes mit Doppelturnhalle sowie die Sanierung des bestehenden Schulgebäudes. Die Arbeiten werden in mehreren Bauetappen durchgeführt. Die Bauarbeiten beginnen nach Abschluss des Schuljahres 2025/2026 ab dem 29. Juni 2026 und dauern voraussichtlich bis Ende Sommer 2028.

### **Rückbau Provisorien und Turnhallengebäude**

Die Rückbauarbeiten der Provisorien und der bestehenden Turnhalle beginnen am 1. Juli 2026 und dauern voraussichtlich bis zu den Herbstferien 2026. Anschliessend erfolgt bis Ende 2026 der Aushub für den Neubau.

### **Neues Schulgebäude**

Der Neubau des Schulgebäudes mit Turnhalle beginnt Anfang 2027 und dauert voraussichtlich bis Ende 2027. Die Sanierungsarbeiten am bestehenden Gebäude beginnen Anfang 2028 und werden bis Ende Sommer 2028 abgeschlossen.

### **Bauphasenpläne**

Detaillierte Angaben zu den Bauetappen können den beiliegenden Bauphasenplänen entnommen werden.

### **Sicherheit auf der Baustelle**

Für die Sicherheit auf der Baustelle ist die Bauleitung des Generaplaners zuständig.  
Dipl. Architekt FH – Herr Valérian Beltrami, 058 451 77 15

Die Gemeinde Binningen sowie die Projekt- und Bauleitung danken der Bevölkerung für das Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen und Immissionen infolge der Bauarbeiten.

Etappierung 01 ab 01. Juli bis 10. August  
Baustelleninstallation während der Schulferien

Perimeter Bau      Pausen fläche

Fussgängerstreifen  
provisorisch gemäss Verkehrskonzept

Sperren der Strasse gemäss Verkehrskonzept  
Trottoir gesperrt

Fussgängerstreifen  
provisorisch gemäss Verkehrskonzept

Zugang Schule

Baupiste von der  
Rottmannsbodenstrasse aus

Umschlagsplatz /  
Abladeplatz

Kein Durchgang über Treppe

Abbruch und Demontage Arbeiten,  
Vordach und Aufbau Provisorium

Pausenfläche  
392.73 m<sup>2</sup>

Pausenfläche  
358.86 m<sup>2</sup>

Pausenfläche  
553.49 m<sup>2</sup>

best. Velounterstand

Lagerfläche


Baucontainer

Baucontainer

Baucontainer

Von dieser Strasse aus gibt es keinen Zugang zur  
Baustelle; der Weg muss stets frei bleiben

# Etappiierung 02 ab 10. August Baustelleninstallation nach der Schulferien

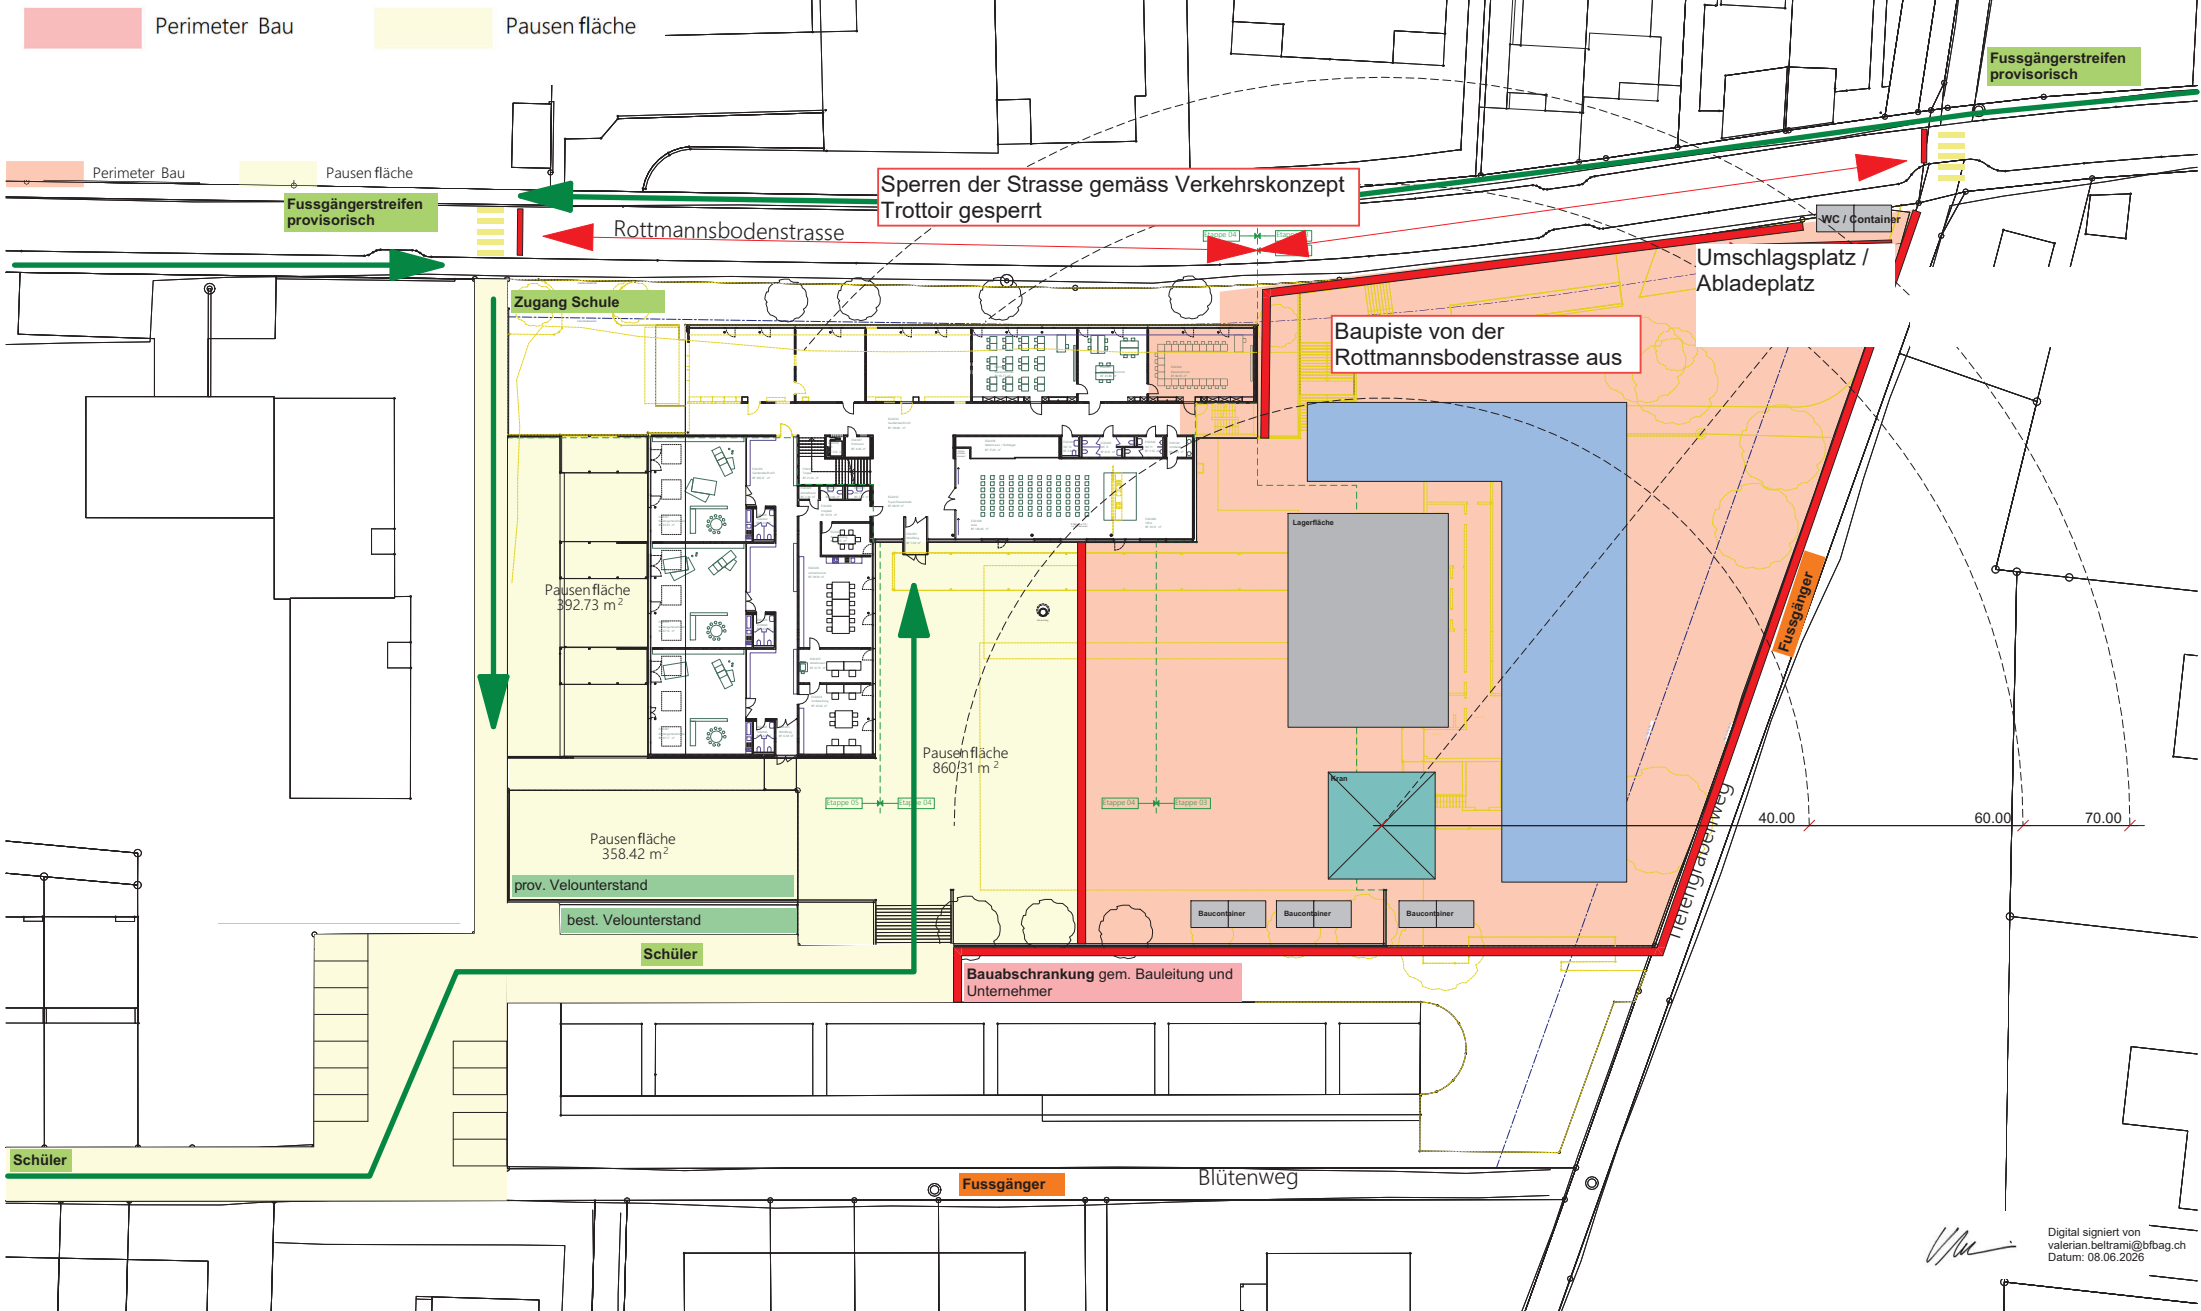

Digital signiert von  
valerian.beltrami@btbag.ch  
Datum: 08.06.2026
